

SSAB OXELÖSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (1/3)

**Installerade belysningslösningar:**

24st Intenz XL 113° 246W

Tidigare installerad effekt: 21,1kW

Ny installerad effekt: 5,9kW

Installerad belysningseffekt W/m²: 4,1 (yta 1 485 m²)

Minskad installerad effekt: 15,2kW, 72 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Projekterad ljusnivå: Medel 512 lux

Uppmätt ljusnivå: 471-705 lux

Luxmätare: Hagner EC-1


"Vi är nöjda med den nya belysningen. Det blir mindre skuggor och det är enklare att syna."

-Sebastian, Hyvlare / Synare



SSAB OXELÖSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (2/3)

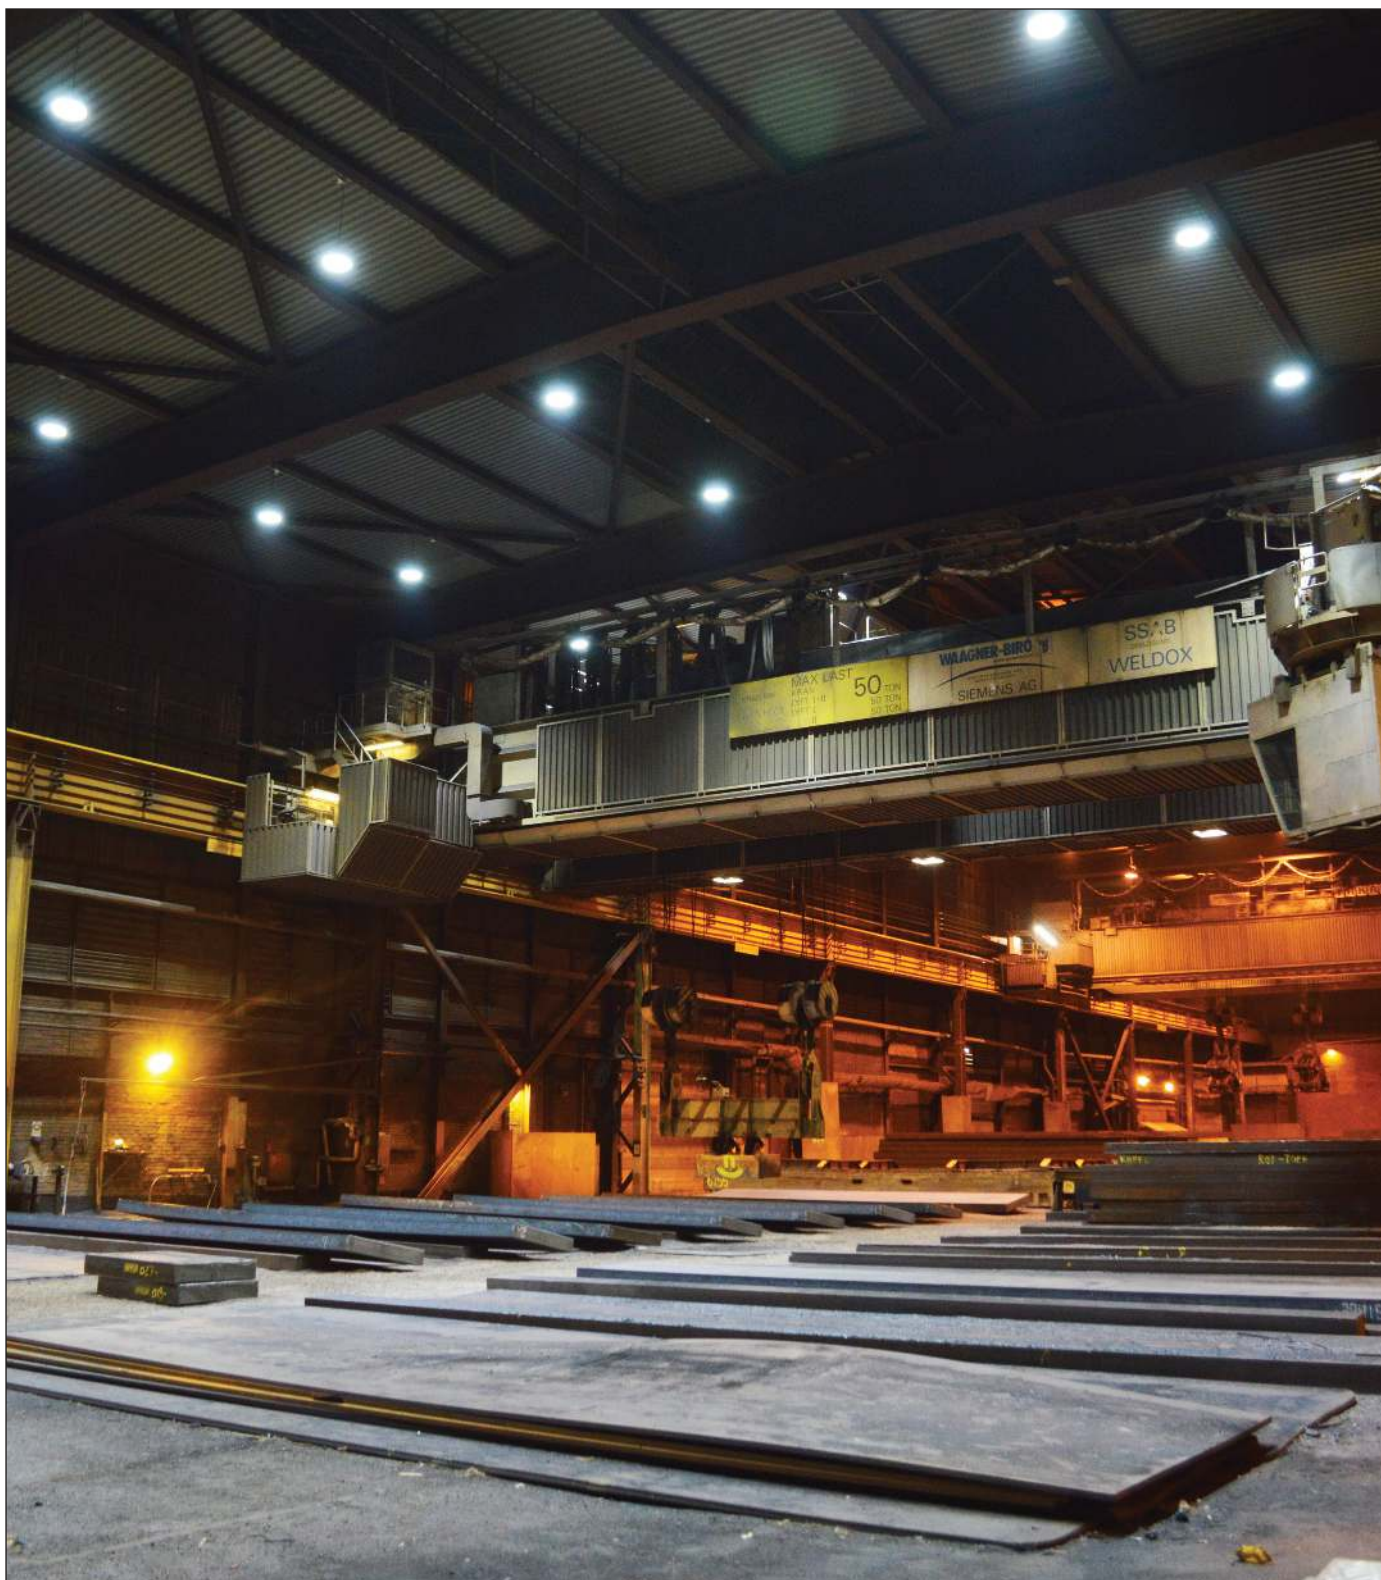

SSAB OXELÖSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (3/3)

