

## SLUTRAPPORT TORGPLATSEN SAMT UTSATTA YTOR (1/4)

SSAB, VALSVERK HALL 2, 31-45

### Energibesparing

#### Belysningslösning

8st intenz M 75°  
30st Intenz HT 70°C 75°

#### Innan åtgärd

Tidigare installerad effekt: 23,0kW  
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 201 830kWh

#### Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 5,6kW  
Ny årsförbrukning (8 760h): 49 476kWh

#### Besparing

Minskad installerad effekt: 17,4kW, 75 %  
Minskad årsförbrukning (8 760h): 152 354kWh


#### Garanterad besparing

Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 8 760h/år:  
1 523 539kWh

### Ljusbildning



Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux  
Projekterad ljusnivå: Medel 317 lux  
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 295-475 lux

Luxmätare: Hagner EC-1

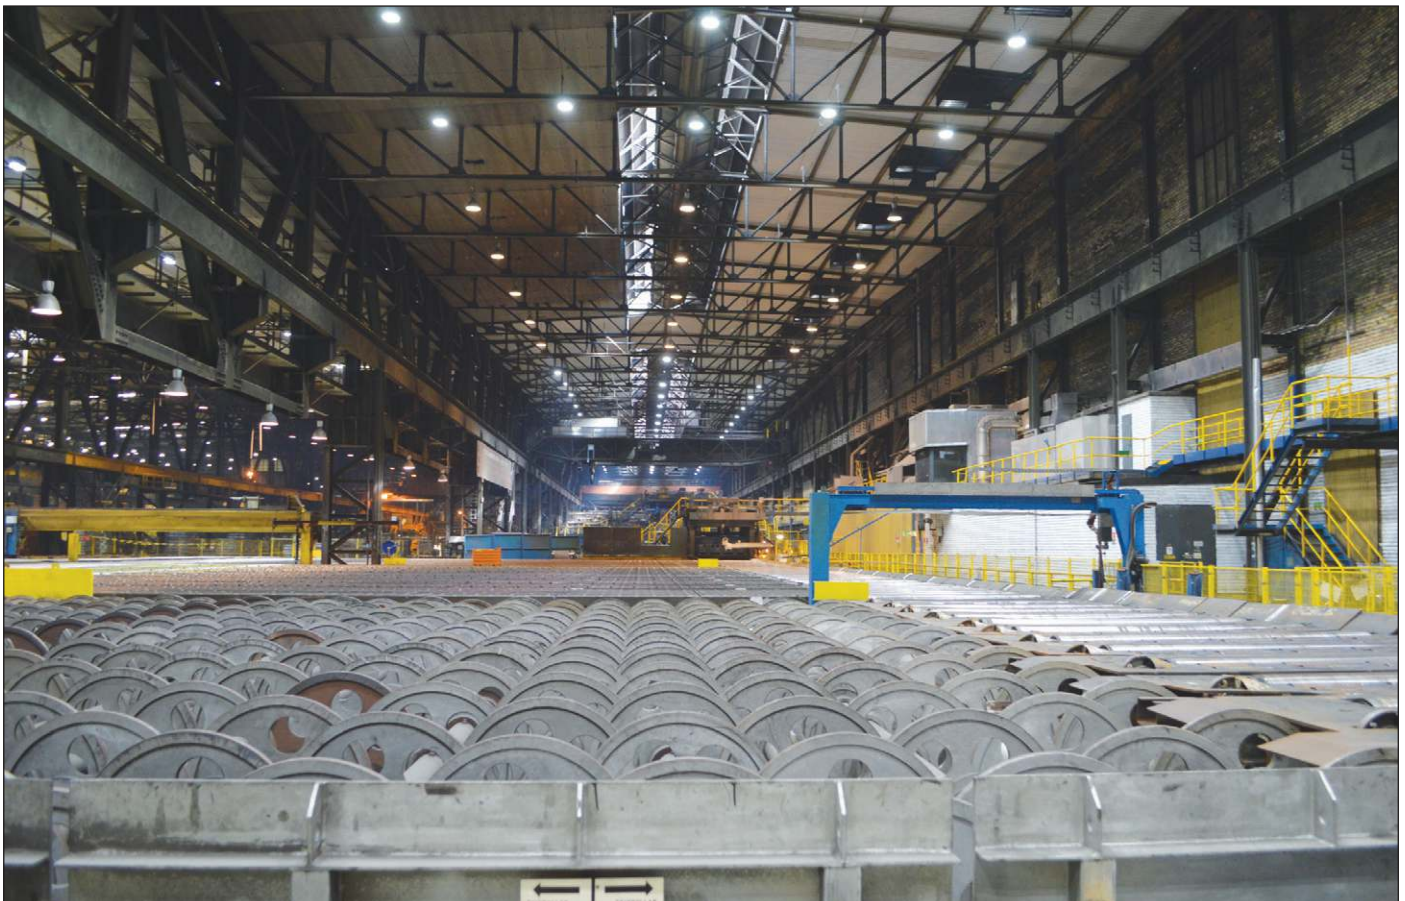

## SLUTRAPPORT TORGPLATSEN SAMT UTSATTA YTOR (2/4)

SSAB, VALSVERK HALL 2, 31-45

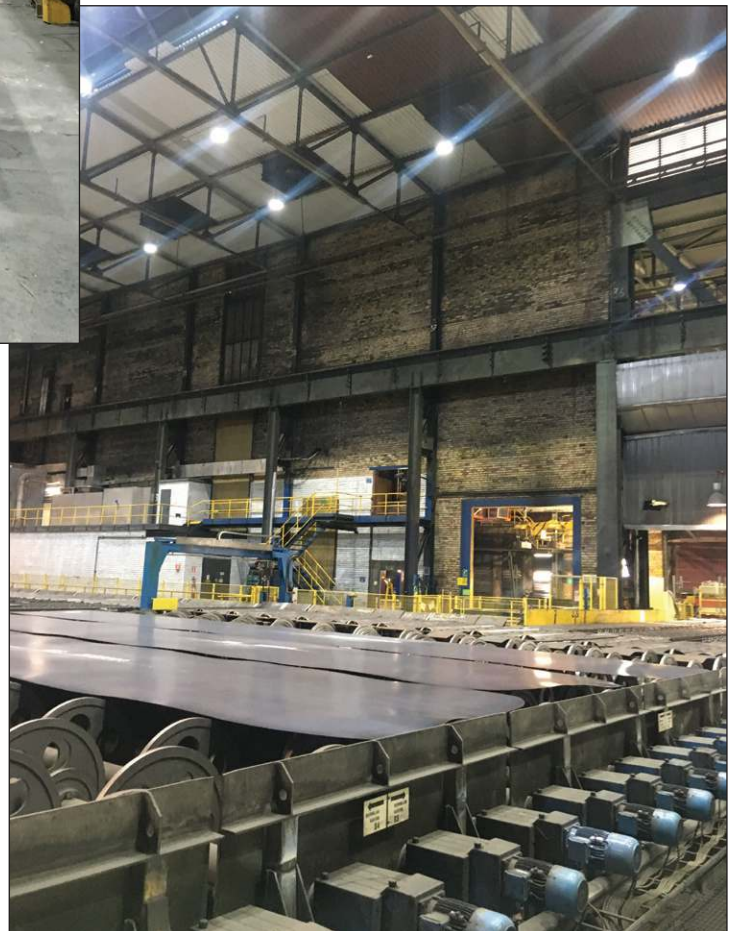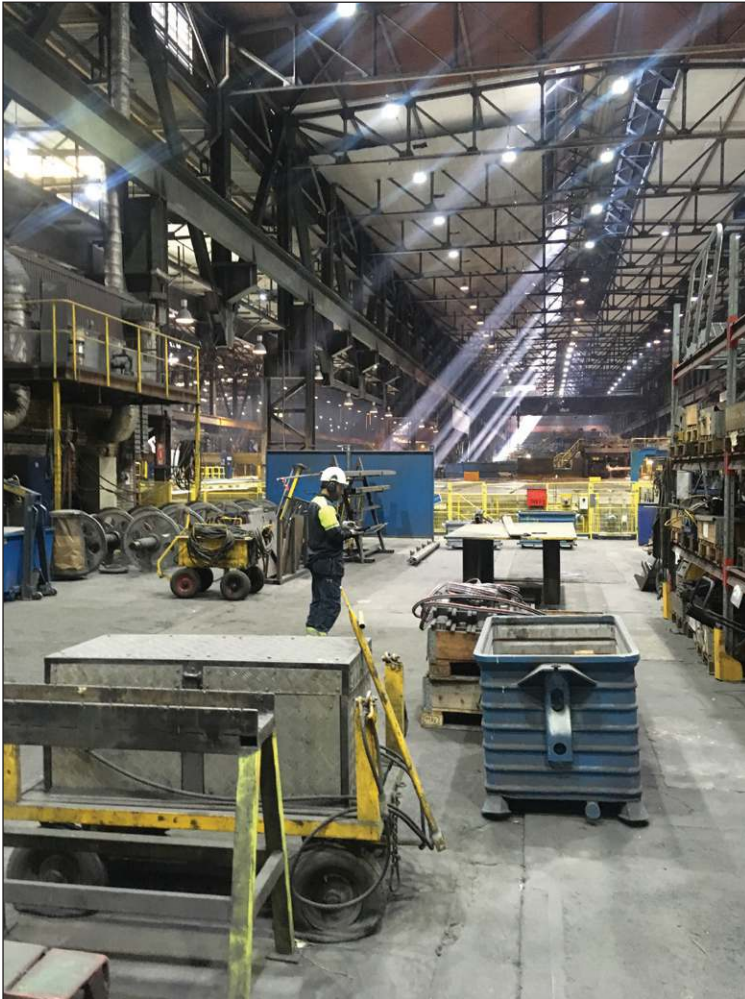


## SLUTRAPPORT TORGPLATSEN SAMT UTSATTA YTOR (3/4)

SSAB, VALSVERK HALL 2, 31-45



## SLUTRAPPORT TORGPLATSEN SAMT UTSATTA YTOR (4/4)

SSAB, VALSVERK HALL 2, 31-45

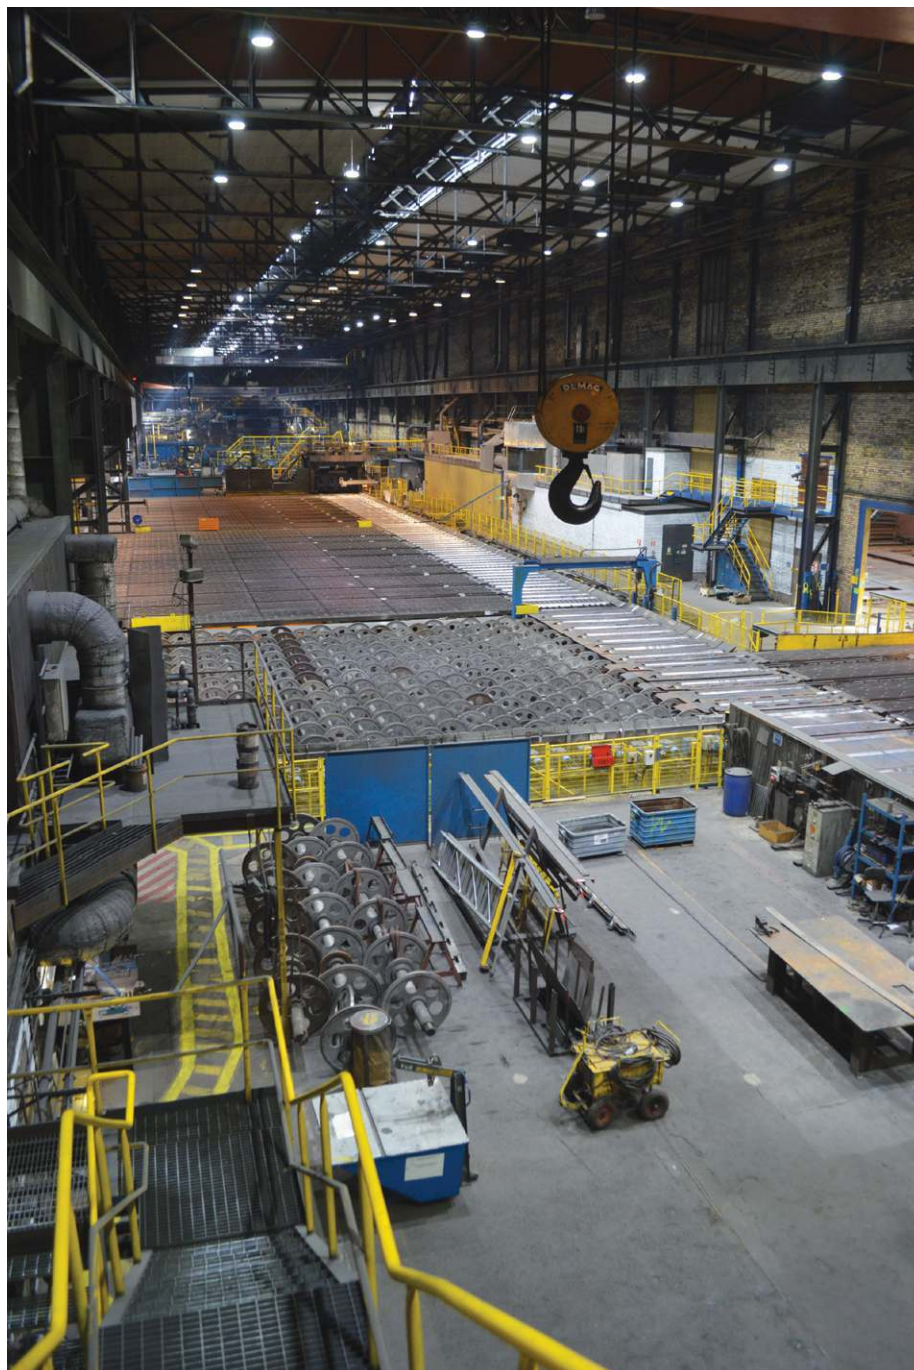

### Ni har investerat i en belysningslösning som...

- uppfyller uppställda ljuskrav och önskemål.
- är energieffektiv.
- är europatillverkad
- är RoHS-certifierad d v s helt fri från farliga tungmetaller.
- bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
- har 10 års funktionsgaranti
